

# Proyecto de Modernización DGCPTN

Mayo 13 de 2019



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

## Reunión de Seguimiento – 13/05/2019

1. **Presupuesto**
2. Flujo de Caja
3. Cuentas Inactivas
4. Asociaciones Público Privadas
5. Sistema Integrado Activos y Pasivos



# PRESUPUESTO

CONTRATO VIG 2018	VALOR PRESUPUESTO 2018	LIBERADO 2018 ENTIDAD	ADICION 2019 - OTRO SI 3	VALOR FACTURADO	% FACTURADO	SALDO POR FACTURAR
Item 1- Crédito Público	\$ 3,358,512,596.00	\$ 236,940,777.57	\$ 41,324,800.00	\$ 2,975,924,719.99	94.09%	\$ 186,971,898.44



## Reunión de Seguimiento – 13/05/2019

1. Presupuesto
2. **Flujo de Caja**
3. Cuentas Inactivas
4. Asociaciones Público Privadas
5. Sistema Integrado Activos y Pasivos



## IMPLEMENTACIÓN FLUJO DE CAJA



### Flujo de Caja- Alcance

#### FASE 1 – Actualización 100%



Implementación de 42 CU

Migración

Análisis y diseño Interoperabilidades

#### FASE 2 – Mejoras 100%



Implementación de 62 CU – incluidas las interoperabilidades de BR – BC-SIIF – PORFIN


#### FASE 3 – Certificación CU 28%



Proceso de Certificación de 53 CU



## Fase I- Paralelo

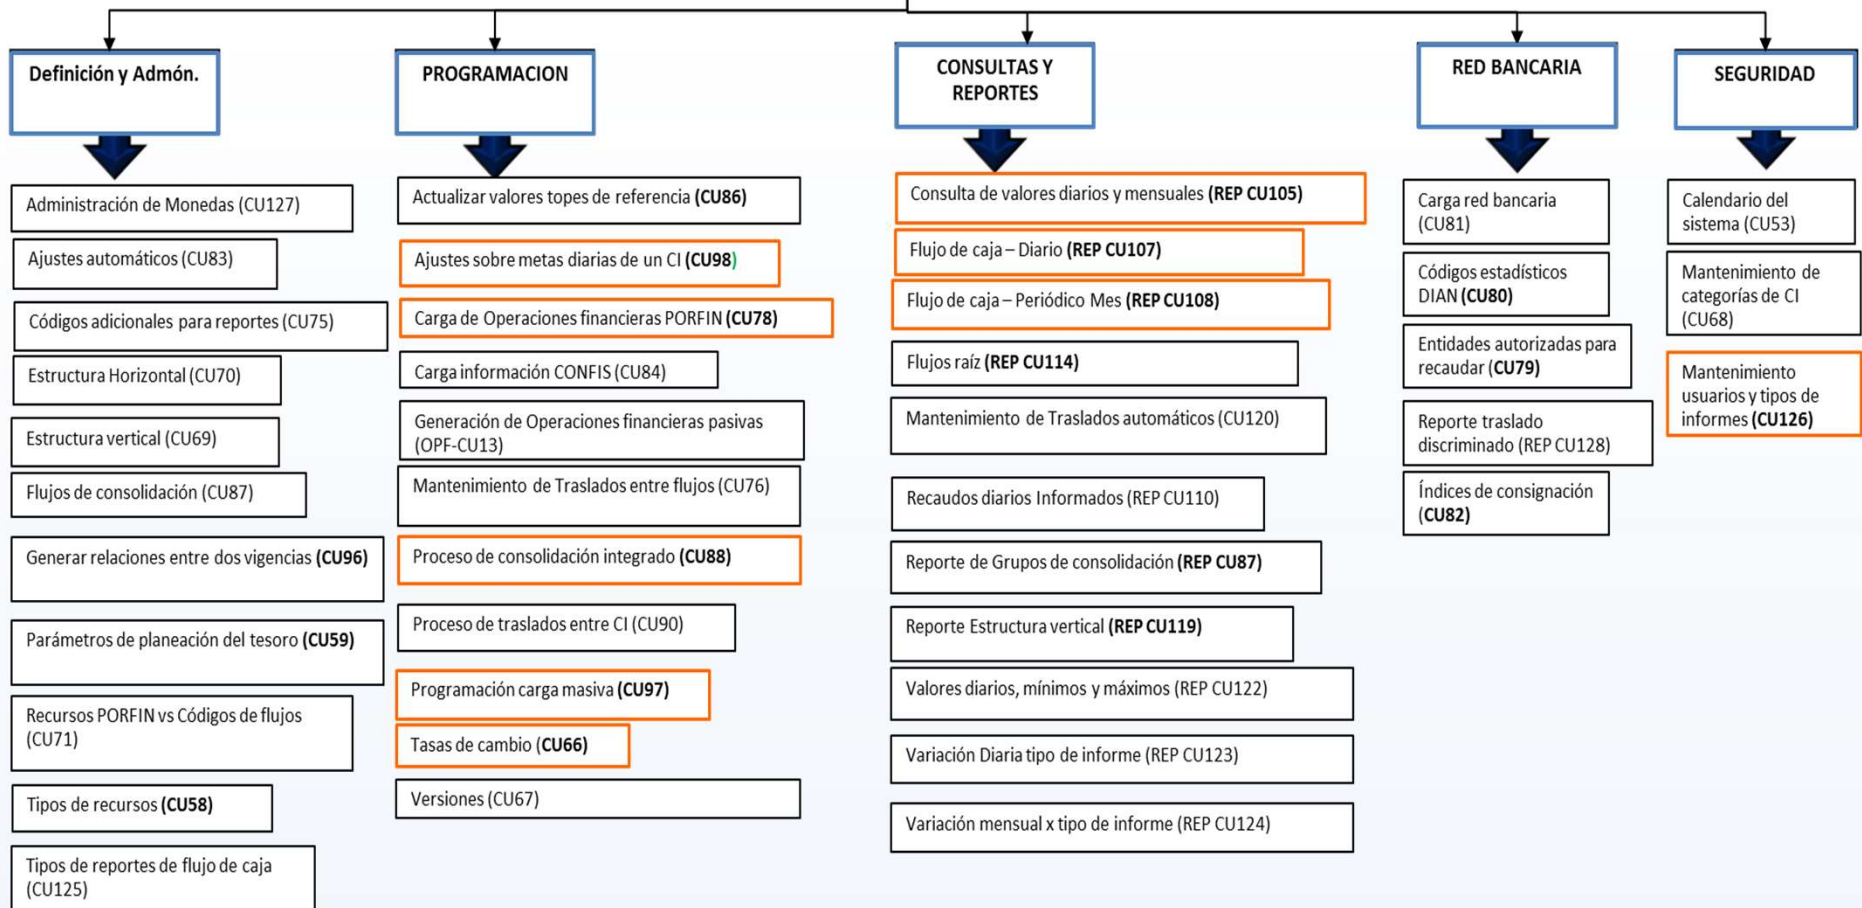

  -> En pruebas Piloto (9)



## FLUJO DE CAJA - CASOS DE USO PLAN B - INTEROPERABILIDAD




C = Certificados Fase 2





UT EVOLUCIÓN DE SOFTWARE 2018

# FLUJO DE CAJA – APROBADOS PRUEBAS

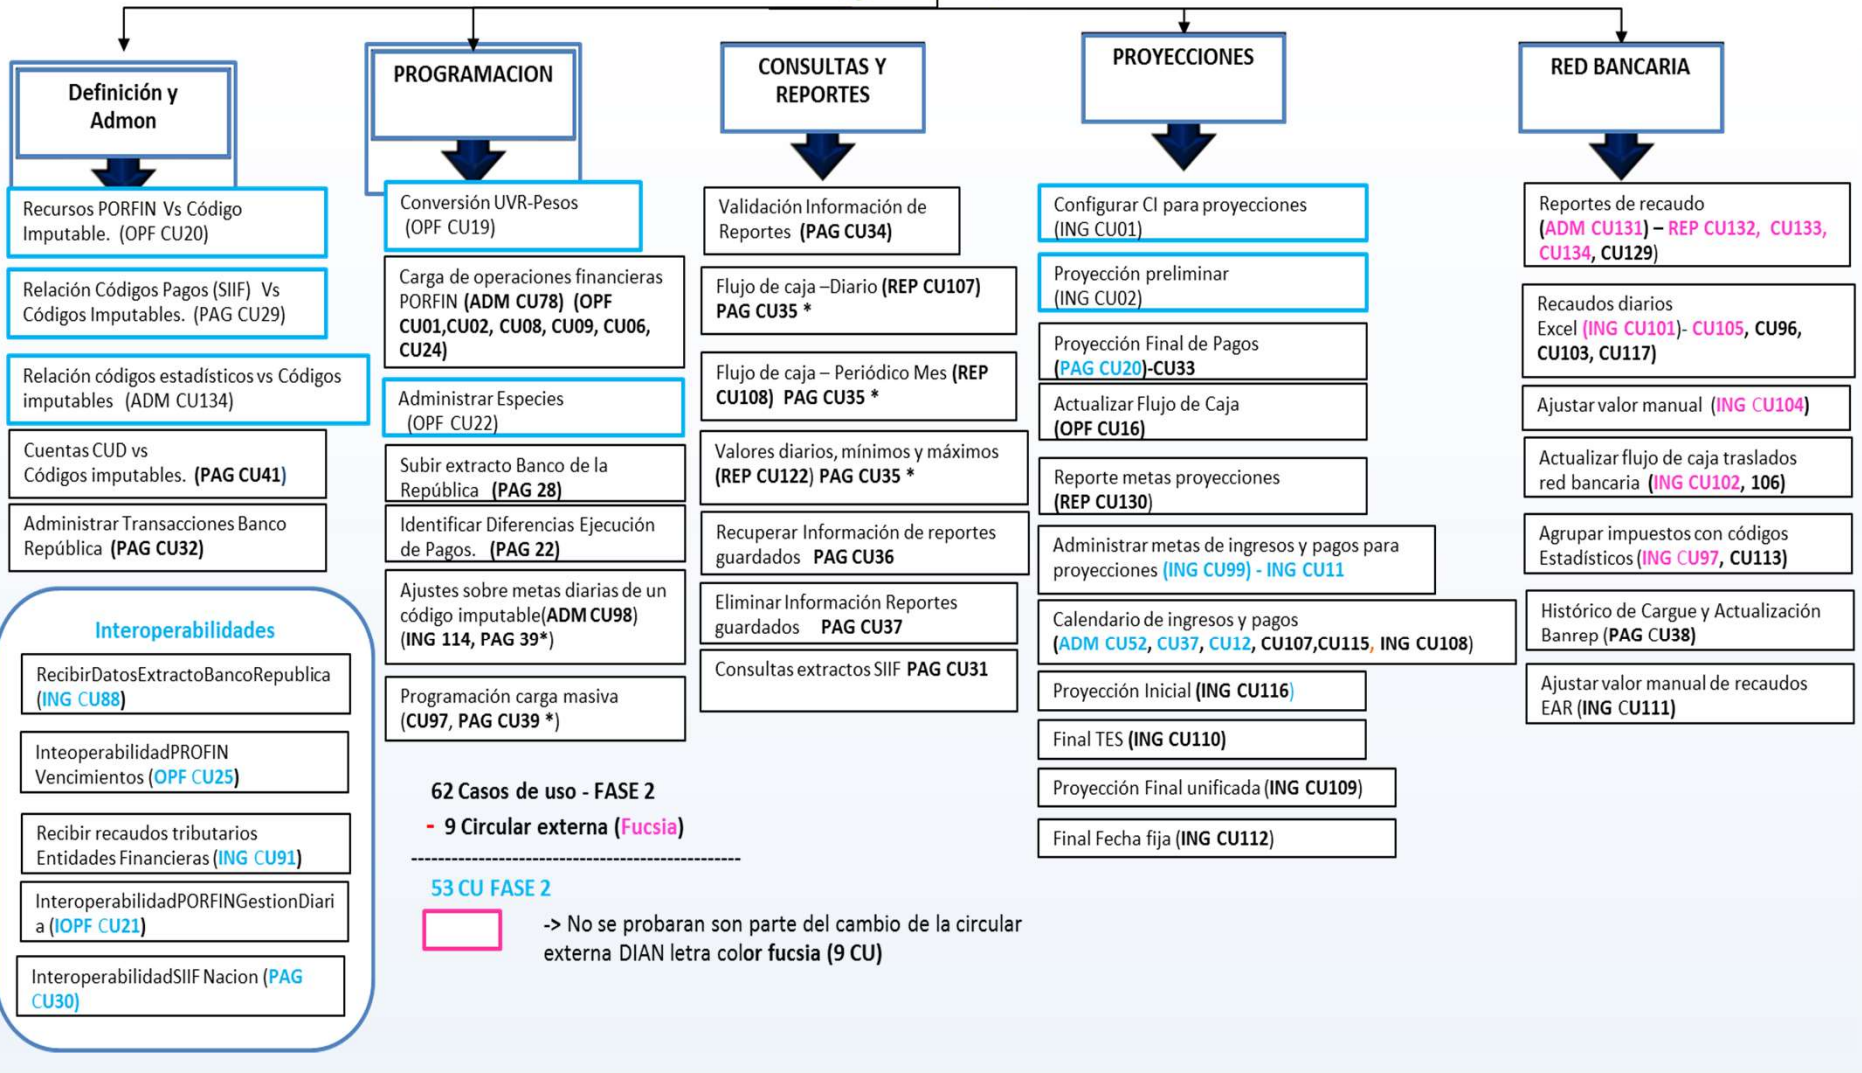

El emprendimiento es de todos

Minhacienda



## FLUJO DE CAJA – CASOS DE USO ENTREGADOS PARA CERTIFICACIÓN

ESTRATEGIA CERTIFICACION						
MAYO				JUNIO		
SEM1	SEM2	SEM3	SEM4	SEM5	SEM6	SEM7
6-10	13-17	20-24	27-31	3-7	10-14	17-21
Red bancaria			Cargues - Plan B			
Calendario/VCFND	Proyecciones		Operaciones F.			



TOTAL CU 53



## FLUJO DE CAJA – CASOS DE USO ENTREGADOS PARA CERTIFICACIÓN



Temas Relevantes:

### PRÓXIMOS HITOS CLAVES / SIGUIENTES PASOS

Actualizar proceso de carga Masiva –FASE II

Revisión de la totalidad de las funcionalidades del paralelo

Apoyo proceso de certificación medio tiempo FASE II

Revisión de mejoras de cambio posterior a la certificación



## Reunión de Seguimiento – 13/05/2019

1. Presupuesto
2. Flujo de Caja
- 3. Cuentas Inactivas**
4. Asociaciones Público Privadas
5. Sistema Integrado Activos y Pasivos



## IMPLEMENTACIÓN CUENTAS INACTIVAS ESTABILIZACIÓN

AVANCE	PORCENTAJE					
REAL	100%					
PLANEADO	100%					
	PROGRESO	0%	25%	50%	75%	100%

DATOS DEL PROYECTO	
Fecha Inicio	21 Agosto 2018
Fecha Finalización	31 Diciembre 2018
Duración	4 Meses
Iteraciones	3
Casos de Uso	41
Líder Proyecto	Sara Palacio

### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

**Casos de Uso Entregados: 41**


**Estado Actual: Puesta en Marcha**

#### Aspectos Relevantes:

- Se realizó el plan de puesta en operación del sistema.
- Se definió paralelo con todas la Entidades para el mes de Julio.
- Se corrió la ETL en Producción.
- Sede Electrónica se encuentra en producción desde el 15 marzo de 2019, aprobada por el usuario.
- Se propuso la atención de incidentes a través de call center pero no tuvo acogida por parte del área Funcional.
- Está pendiente el Manual Operativo por parte del área funcional.



## IMPLEMENTACIÓN CUENTAS INACTIVAS ESTABILIZACIÓN

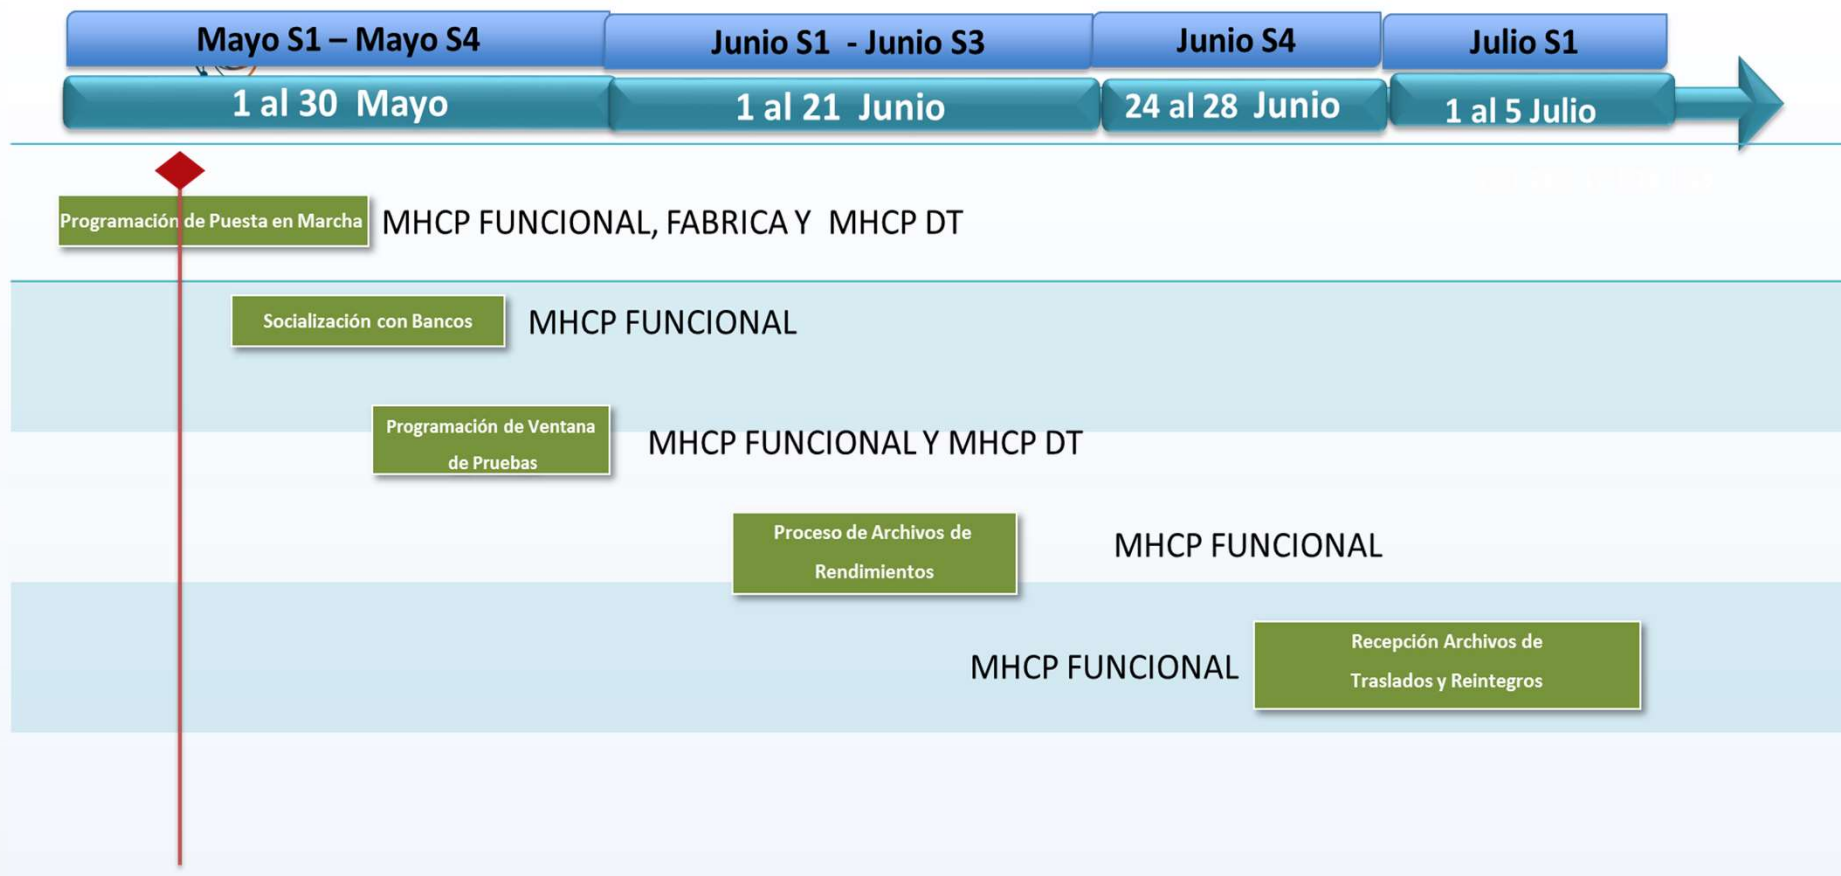

## IMPLEMENTACIÓN CUENTAS INACTIVAS ESTABILIZACIÓN



Temas Relevantes:

### PRÓXIMOS HITOS CLAVES / SIGUIENTES PASOS

Programación de Conciliación de Saldos entre el MHCP y las Entidades Financieras

Programación de paralelo con Entidades Financieras.



## Reunión de Seguimiento – 13/05/2019

1. Presupuesto
2. Flujo de Caja
3. Cuentas Inactivas
4. **Asociaciones Público Privadas**
5. Sistema Integrado Activos y Pasivos



## IMPLEMENTACIÓN ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS AVANCE FASE 1

AVANCE	PORCENTAJE					
REAL	100%					
PLANEADO	100%					
	PROGRESO	0%	25%	50%	75%	100%

### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

**Casos de Uso: 12**

**Estado Actual:** Producción

**Aspectos Relevantes:**

- Se encuentra en Producción desde el 2 de abril 2019.
- A la fecha no se han reportado hallazgos funcionales.


### MÓDULOS

- Parámetros
- Proyectos
- Administración Usuarios





## IMPLEMENTACIÓN ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS AVANCE FASE 2



DATOS DEL PROYECTO	
Fecha Inicio	14 Enero 2019
Fecha Finalización	30 Abril 2019
Duración	3,5 Meses
Iteraciones	2
Casos de Uso	14
Líder Proyecto	Sara Palacio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
<b>Casos de Uso: 14</b> <b>Estado Actual:</b> Pruebas Área Funcional

MÓDULOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valoración Riesgos</li> <li>• Asignación y Cualificación de Riesgos</li> <li>• Plan de Aportes</li> <li>• Reportes</li> </ul>

## IMPLEMENTACIÓN ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS AVANCE FASE 2


		ESTADO CASOS DE USO							TOTAL
		TOTAL	DOCUMENTADOS		DESARROLLO		PRUEBAS		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
<b>FASE II</b>	Cualificador, Valoración y Aportes	9	9	100%	9	100%	9	99%	<b>96%</b>
	Reportes	5	5	100%	5	100%	5	90%	



UT EVOLUCIÓN DE SOFTWARE 2018

# IMPLEMENTACIÓN ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS ESTADOS CASOS DE USO FASE 2


ESTADO FASE II

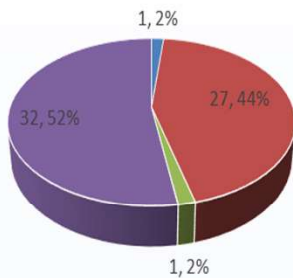

■ Configuración Equipo de Usuario ■ Control de Cambios  
■ Documentación ■ Errores Funcionales


TIPO	Cantidad
Configuración Equipo de Usuario	1
Control de Cambios	27
Documentación	1
Errores Funcionales	32
<b>Total</b>	<b>61</b>

Estado Controles de Cambio



■ Analizados por Tecnología ■ Desarrollos con cargo a costo de la Fabrica

Estado Errores Funcionales



■ Aceptado por Funcional ■ En desarrollo  
■ Pendiente pruebas Funcional

Estado	Cantidad
Aceptado por Funcional	23
En desarrollo	1
Pendiente pruebas Funcional	8
<b>Total</b>	<b>32</b>

ESTADO CONTROLES DE CAMBIO

Estado	Cantidad
Analizados por Tecnología	22
Desarrollos con cargo a costo de la Fabrica	5
<b>Total</b>	<b>27</b>



El emprendimiento es de todos


Minhacienda

## IMPLEMENTACIÓN ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS ESTRATEGIA CERTIFICACIÓN

✓ Apoyo de 3 horas diarias para pruebas los días Entre el 14 y el 16 de Mayo 2019

ESTRATEGIA CERTIFICACION FASE 2 ASOCIACIONES PUBLICOS PRIVADAS					
Martes 14		Miercoles 15		Jueves 16	
Cualificacion	4 casos de uso	Valoracion	4 casos de uso		
Peajes	2 casos de uso	Plan de aportes	3 casos de uso	Reportes	3 casos de uso

# IMPLEMENTACIÓN ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS PRÓXIMAS ENTREGAS

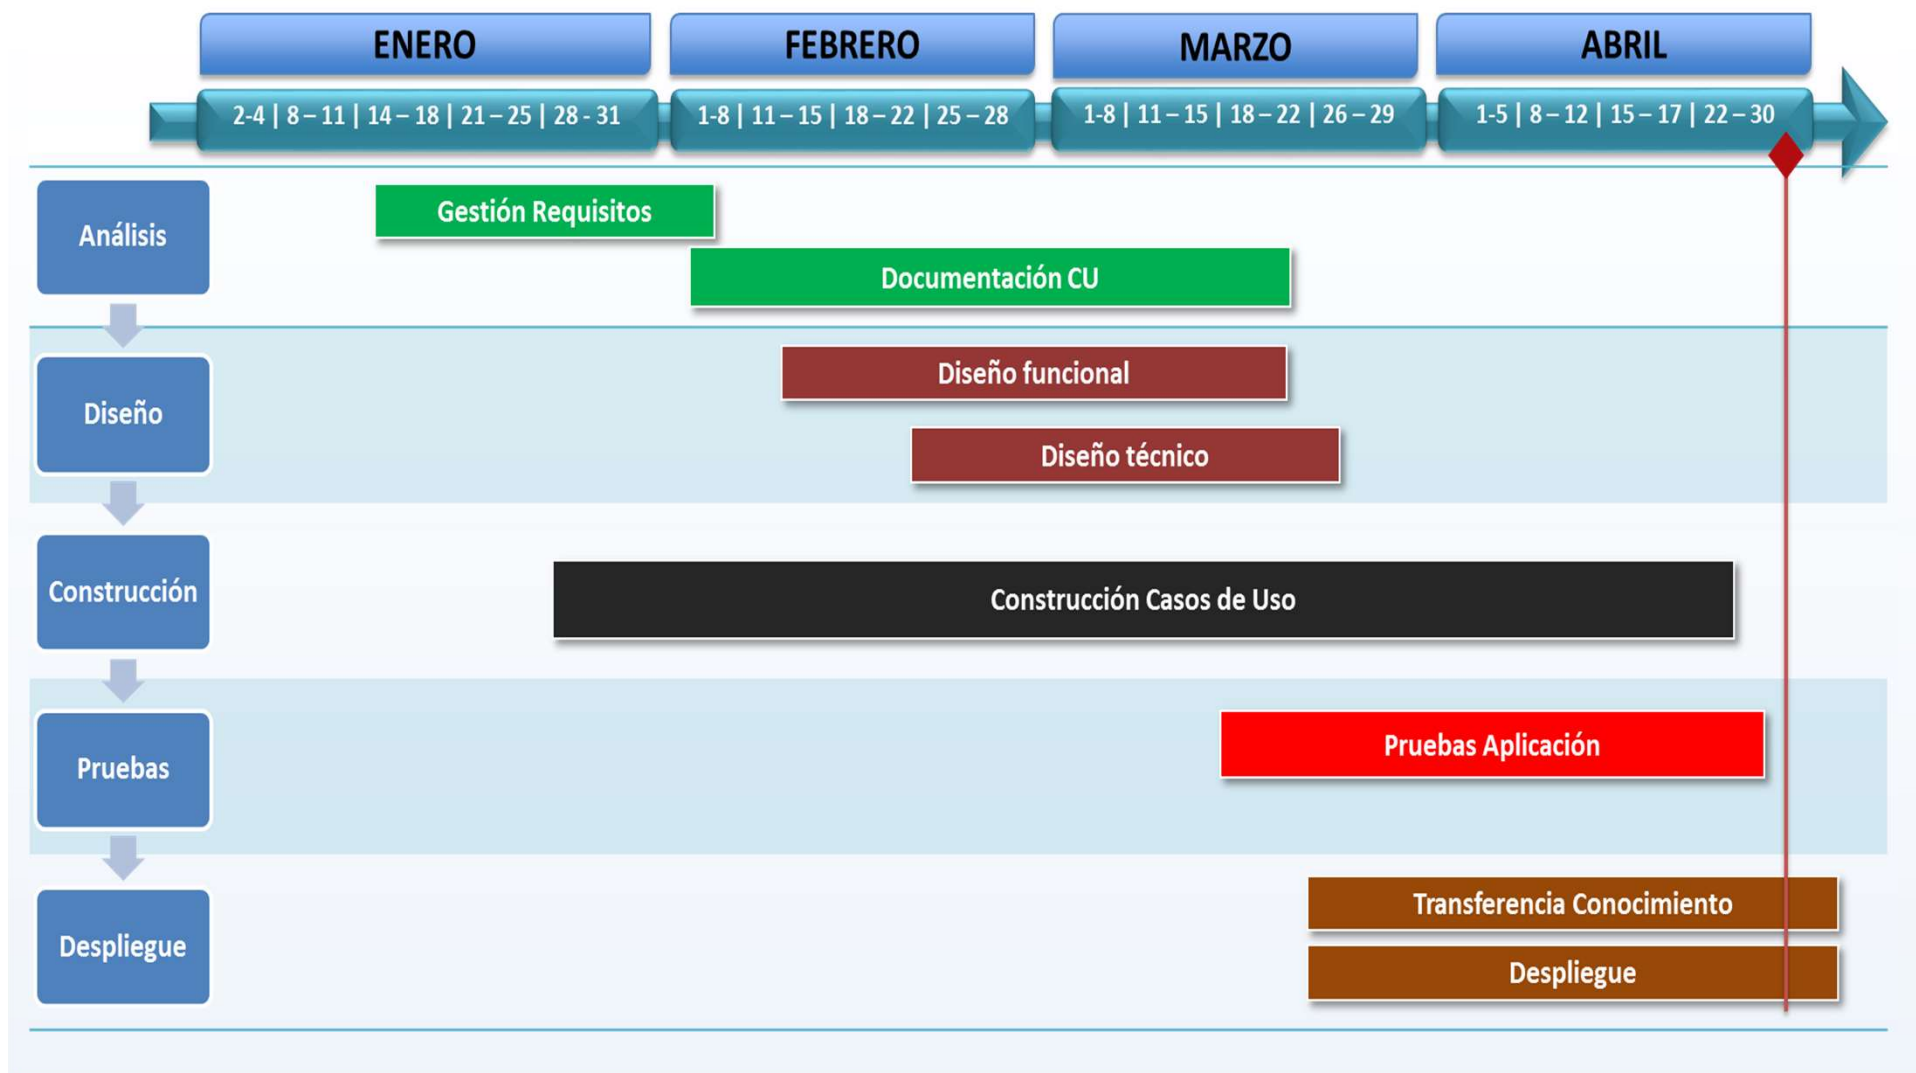

## Reunión de Seguimiento – 13/05/2019

1. Presupuesto
2. Flujo de Caja
3. Cuentas Inactivas
4. Asociaciones Público Privadas
5. **Sistema Integrado Activos y Pasivos**



## Próximas Prioridades



100%/96%

Cierre Desarrollo  
Estabilizar producción  
Funciones adicionales con Dirección Tecnología

Estudio de Mercado y reunión general con potenciales proveedores  
Presentaciones MSCI, Calypso y SAP  
Prueba Piloto con activos y pasivos representativos  
Estudios Previos, Contratos, Plan de Adquisición 2019 y Vigencias Futuras

100%

Cierre Desarrollo  
Estabilizar Producción  
Socialización, paralelo y corte datos con entidades

100%/100%/28%

Cierre a paralelo primera fase  
Certificación Fase II  
Paralelo segunda fase

**Mayo,  
Junio y  
Julio**



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

## Cronograma 2019

Actividad	Fecha Final Nueva
Revisión y aprobación requerimientos DGCPTN	8-may
<b>Ajustes al documento Dirección Tecnología y DGCPTN</b>	<b>13-may</b>
Estudio de Mercado con Potenciales Proveedores	2-jun
Consolidación Estudios Previos	18-jun
Radicación Contratos	18-jul
Estudios previos SECOP	7-ago
Estudio definitivo	22-ago
Ofertas	6-sep
Informe Evaluadores	21-sep
Acto Administrativo Adjudicación	26-sep
Firma Contrato y Garantías	11-oct
<b>Inicio Implementación</b>	<b>16-oct</b>





## Selección de Proveedores Abril y Mayo

### **FIS, Murex, Finastra y Heinsohn :**

Presentación realizada, respuestas recibidas

### **Metacase, MSCI, Calypso y SAP:**

Contactadas y presentación pendientes

**Aladdin:** Presentación realizada, NDA en discusión

**Sage y Sophos:** Por contactar

## 5. RiskTech100® 2019 ranking

Rank 2019	Rank 2018	Company	HQ	Total score	Fur
1	1	FIS	US	73.1%	
2	2	Oracle	US	72.4%	
3	3	MSCI	US	71.0%	
4	5	Moody's Analytics	US	70.1%	
5	4	SAS	US	69.3%	
6	6	Murex	France	67.4%	
7	12	FICO	US	67.3%	
8	7	Finastra	UK	66.8%	

